



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ส ๑๕/๒๕๖๖

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ตำบล/แขวง เสมาใหญ่ อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดย นายอุเทน ศรีนอก ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๗ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง คูขาด อำเภอ/เขต คง จังหวัด นครราชสีมา โดยนายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียน เลขที่ ๑๐๐๙๒๐๖๒๔๐๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่าย หนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ สายทาง จากบ้านนางสวย กุนอก ถึงถนน ค.ส.ล. หน้าสวนนางเหรียญทอง แฝ้วชำนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด กว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๑.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ณ บริเวณจากบ้านนางสวย กุนอก ถึงถนน ค.ส.ล. หน้าสวนนางเหรียญทอง แฝ้ว ชำนาญ ตำบล/แขวง เสมาใหญ่ อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อ ใช้งานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรค่า K จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ตารางกำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๖,๑๐๐.๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗,๙๘๑.๓๑ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดงาน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนางสวย กุณอก ถึงถนน ค.ส.ล. หน้าสวนนางเหรียญทอง แคว้นชำนาญ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา
ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เดิมตาม
จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ
ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหาก
ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า
นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้
เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลัก
ประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้
คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่า
จ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิด
ต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะ
ได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวัน
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หัก
เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไป
แล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มา
วางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี
มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว

ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จครบบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จครบบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่

ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาอีกด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๒๒.๐๐ - บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน

กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ขอใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

สูตรค่า K

งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10Mt/Mo + 0.30At/Ao + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๔๕๓๗๔๖๘
เลขคุมสัญญา ๖๖๐๖๒๒๐๐๖๕๗๑



หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00015/66

วันที่ 14 มิถุนายน 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อ หจก. โชคดีมกก่อสร้าง

87 หมู่ 5 ตำบลคูขาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก บ้านหม้อคา หมู่ที่ 2 เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บัวใหญ่ เลขที่ 100062202631 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566	2208010101.001	6,100.00	สัญญาเลขที่ ส 15/2566 (CNTR-00085/66)
รวมเงิน			6,100.00	
ตัวอักษร (หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				

ลงชื่อ



ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน





ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORN BANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100062202631

วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 207 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวนิศานันท์ โนมขุนทด และ นางสาวอรพิน พลกล้า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหน้าวัด หมู่ที่ 2 จากบ้านนางสวย กุณอก - ถนน คลส. หน้าสวนนางเหรียญทอง แคว้นชำนาญ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 15/2566 ลงวันที่ _____ ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 6,100.00 บาท (หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 6,100.00 บาท (หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวนิศานันท์ โนมขุนทด)

อรพิน พลกล้า

(นางสาวอรพิน พลกล้า)

ผู้ค้ำประกัน

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสรินทร นาราสมุทร)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายวีรวัฒน์ เมืองวงศ์)

พยาน

การขอยื่นหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ให้อาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-28705478-1-3 :-

EFF_C_1_YN_PLUS

2487293

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ. ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนางสวย กุณอก ถึง ถนน ค.ส.ล. หน้าสวนนางเหรียญทอง แฝ้วชำนาญ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๑๒๖,๘๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนางสวย กุณอก ถึง ถนน ค.ส.ล. หน้าสวนนางเหรียญทอง แฝ้วชำนาญ ขนาดกว้างประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๑.๘๐ เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ กรรมการ

๓. นางสาวมยุรี รักษาภักดี กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)



(ลงชื่อ).....
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

ประกอบการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนางสวย กุนอก ถึง ถนน ค.ส.ล.หน้าสวนนาง
เหรียญทอง แฝ้วชำนาญ

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาสมัชชาสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ ใช้จ่ายเงินสะสมโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยาคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนางสวย กุนอก ถึง ถนน ค.ส.ล. หน้าสวน นางเหรียญทอง แฝ้วชำนาญ ขนาดกว้างประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๑.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนอบต.เสมาใหญ่กำหนด งบประมาณ ๑๒๖,๘๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้สัญจร ไปมาที่สะดวก ปลอดภัย ในทุกฤดูกาล

๒.๒ เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร รวดเร็ว มากขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เชื้อถือ

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)



ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)

ทอ้ง

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

Handwritten signature in blue ink.

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้างของงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยคา หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้างประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๑.๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลน อบต.เสมาใหญ่กำหนด งบประมาณ ๑๒๖,๘๐๐.- บาท ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว

๕. พัสตประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๖. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒


๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๖,๘๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน

จำนวนงวดงาน ๑ งวด และการจ่ายเงินงวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น

๑๑. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๒. การกำหนดระยะเวลาประกันชำรุดบกพร่อง

ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน

.....

ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานตามโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ สายทางจากบ้านนางสวย กุณอก ถึง ถนน ค.ส.ล. หน้าสวน นางเหรียญทอง แ้วชำนาญ ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน

(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)



(ลงชื่อ).....
(นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)



(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายทางจากบ้านนางสวย กุบอก ถึง ถนน ค.ส.ล.หน้าสวนนางเหรียญทอง แผล้วชำนาญ
บ้านหม้อคา หมู่ที่ 2 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 204 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 91.80 ลูกบาศก์เมตร (แน่นอน)


พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร. 0 - 4497 - 6218	
เขียนแบบ	 (นายสิงขรณ์ สิงขรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	 (นายสิงขรณ์ สิงขรณ์) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	 (นางนลินศรี ชนาทรศรีสมบัติ) ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
อนุมัติ	 (นายเทน ศรีนอก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
CIVIL - 65	วันที่ 22 พ.ค. 66
แบบเลขที่ ๗๒-1/2566	แผ่นที่ 1/5
มาตราส่วน	not to scale

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)




(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)

พัศวรรณ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ศิริยาภรณ์

ทิศเหนือ

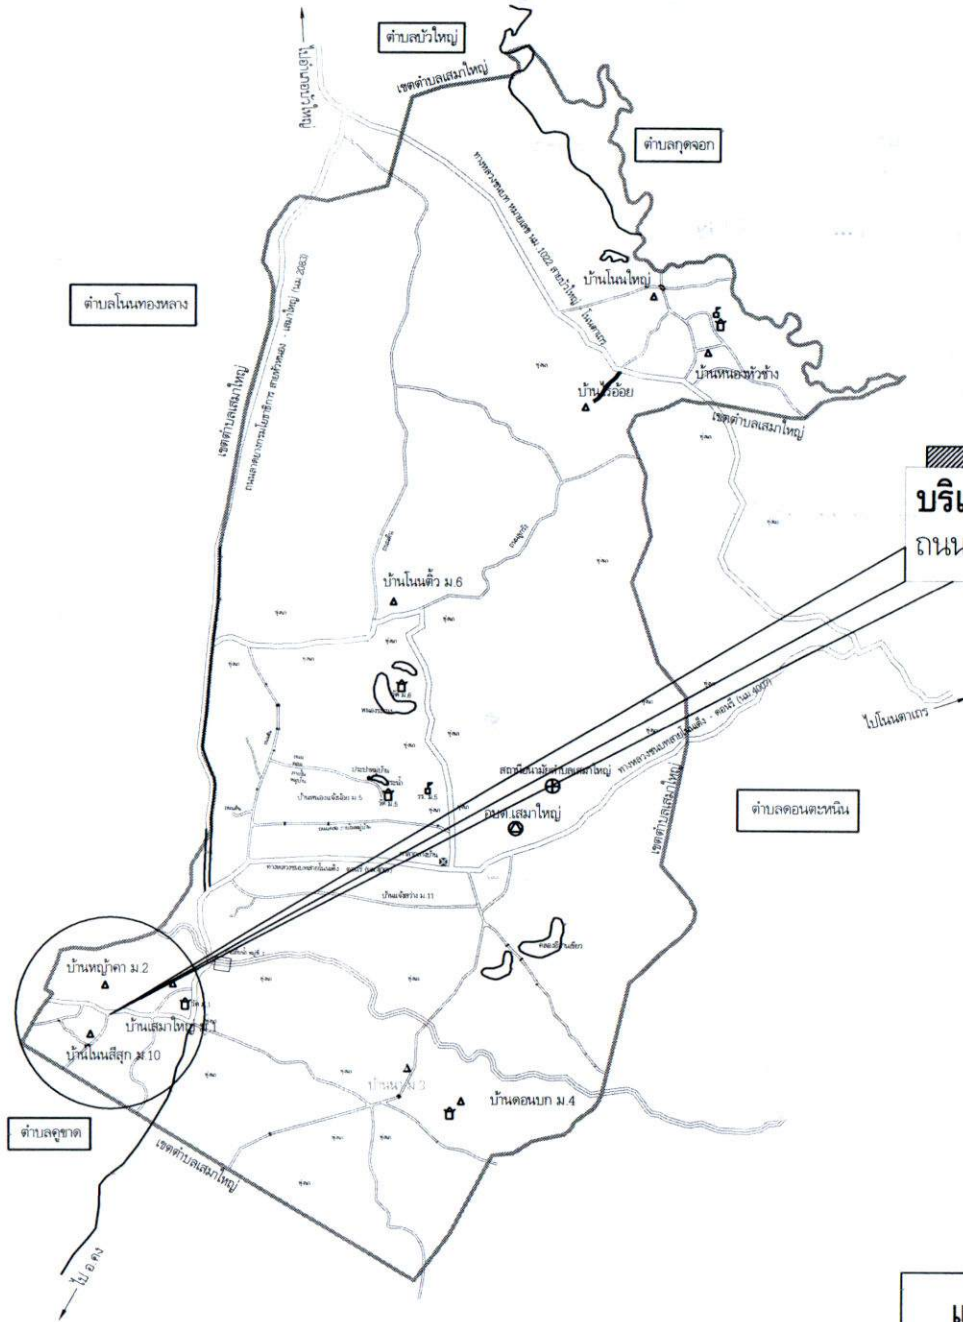

**บริเวณสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้านหมู่ 2**

แผนที่สังเขปตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โทร. 0 - 4497 - 6218

เขียนแบบ
(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ
(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางเจ้านิสา ชวนรงค์สมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อนุมัติ
(นายอุเทน ศรีนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่


CIVIL - 65 วันที่ 22 พ.ค. 66


หมายเลขที่ กข 2-1/2566 แผนที่ 2/5


มาตราส่วน not to scale

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)




(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

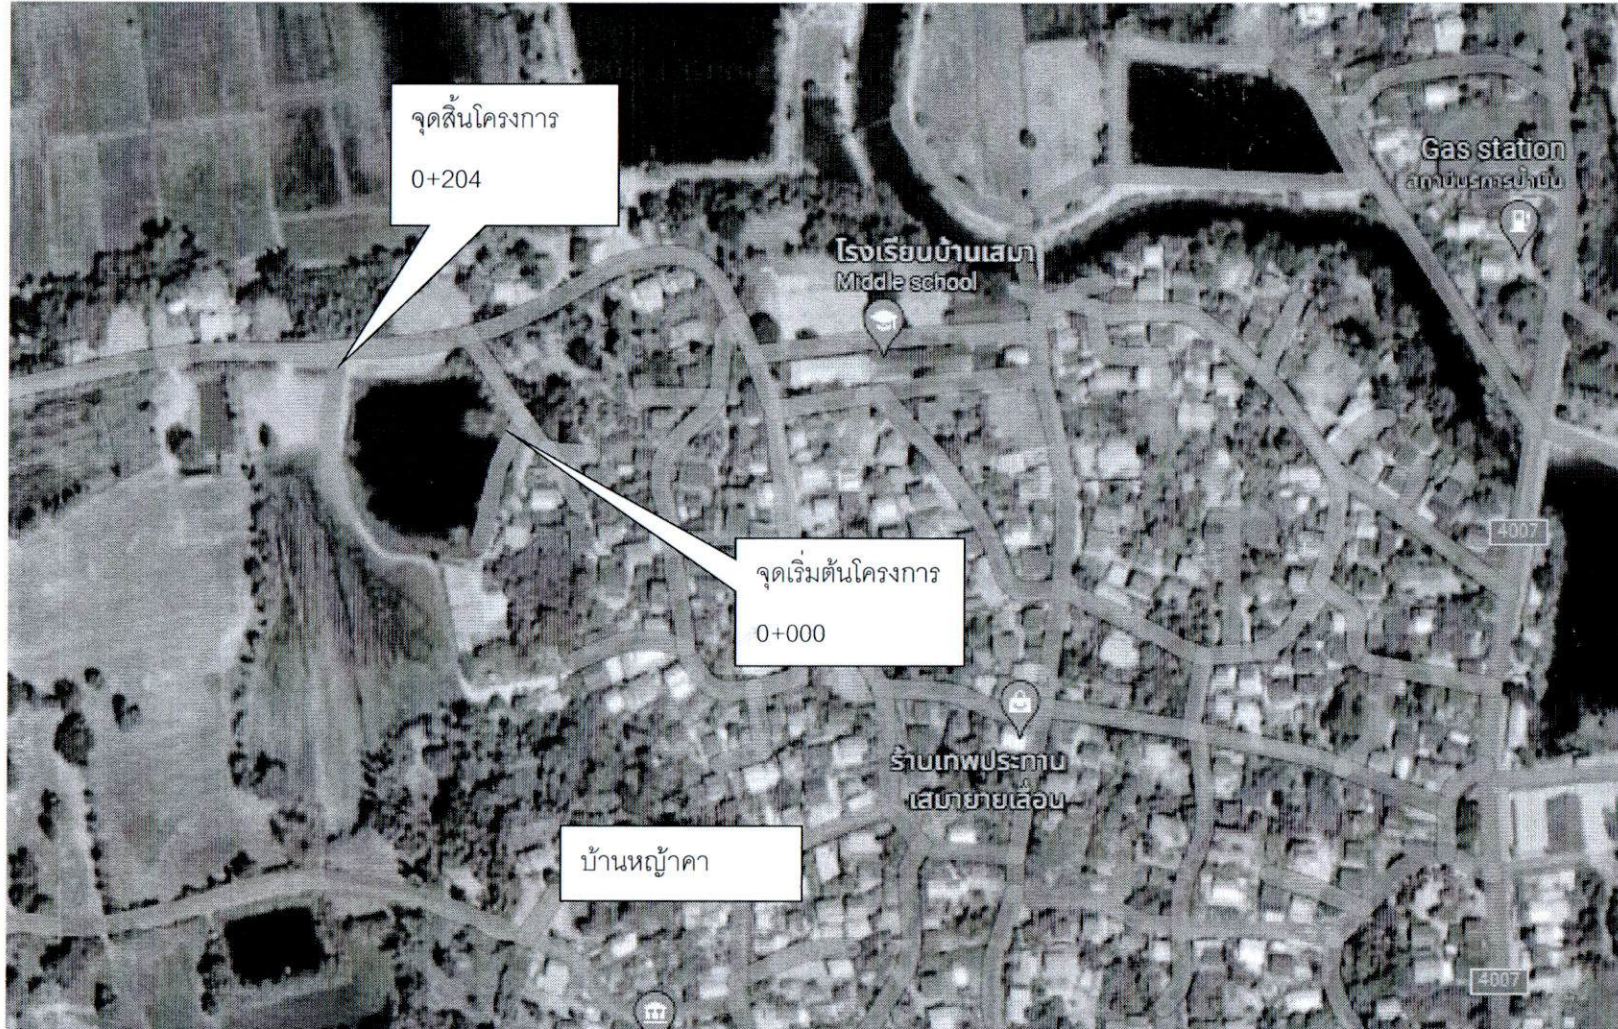

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
 142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่
 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 โทร. 0-4497-6248

เขียนแผน
 (นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ
 (นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 (นางนลินศิรินทร์ ชนชากรศิริสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อนุมัติ
 (นายอุเทน ศรีนอก)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

CIVIL-65 วันที่ 22 พ.ค 66

แบบเลขที่ ๙๗๒-1/2๕๖๖ แผ่นที่ 3/5

มาตราส่วน not to scale

ผังบริเวณโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
ทต.นม. 01-105

แบบ :
มาตรฐานถนนหินคลุก

มาตรฐาน
ระยะในแบบ

เขียนแบบ
นายวิมลศักดิ์ ชัยกลาง

วิศวกรโยธา
นายสมเกียรติ พงษ์เทพเลิศ
สช. 10075


เห็นชอบ

นาง พิชิตฉัตร ขวัญศรีเกษม
ผู้อำนวยการกองช่าง
ปฎิบัติหน้าที่ ส.ส.อ.ส.ค.ส.
นครราชสีมา

อนุมัติ

นาย อุตม อภิรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เกษมสินธุ์

แผ่นที่ 22/10/2550
4/5 1

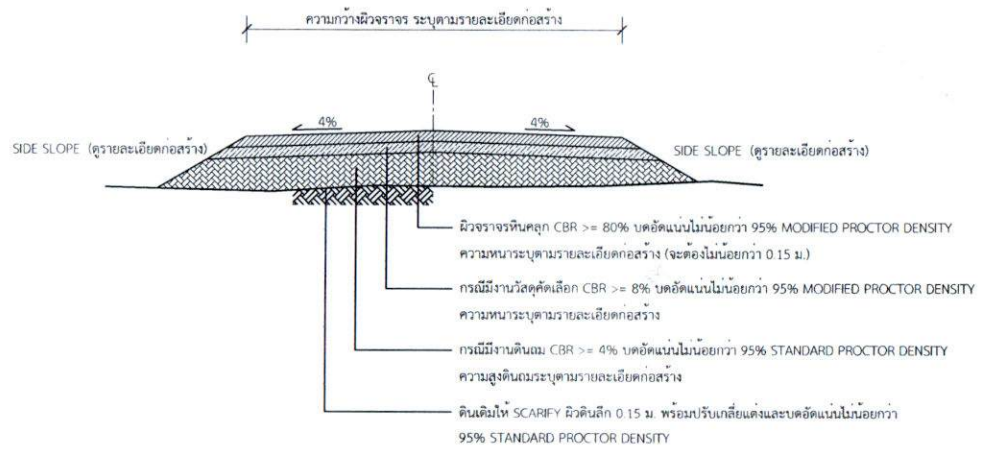

รูปตัดตามขวางถนนหินคลุก

รายการประกอบแบบ

1. คู่มือสมบัติของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างทางให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น
- มถ. 201-2550
 - มถ. 202-2550
 - มถ. 203-2550
 - มถ. 204-2550
 - มถ. 301-2550
 - มถ. 302-2550
 - มถ. 303-2550
 - มถ. 304-2550
 - มถ. 305-2550
 - มถ. 306-2550
- (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)

*วัสดุและวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

Handwritten signature in blue ink

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

Handwritten signature in blue ink



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
ทถ.ม. 03-101

แบบ :
มาตรฐานป้ายโครงการก่อสร้าง

มาตราส่วน ระบุในแบบ

เขียนแบบ

นายธีรสิทธิ์ ชื่นเมือง

วิศวกรโยธา

นายสมเกียรติ ภัททะผล
ทอ.10075


เห็นชอบ

นางสาว นลินีศรี ขนาดศรี วิศวกรโยธา
ผู้อำนวยการกองโครงสร้าง
ถนนปัทมาการขจรวิภาสารามคำชะโนด


อนุมัติ

นางอุบลาน ศรีนอก
นางกองค้ำท้าววิบูลย์สงคราม

แผ่นที่ จำนวน
5/5 1

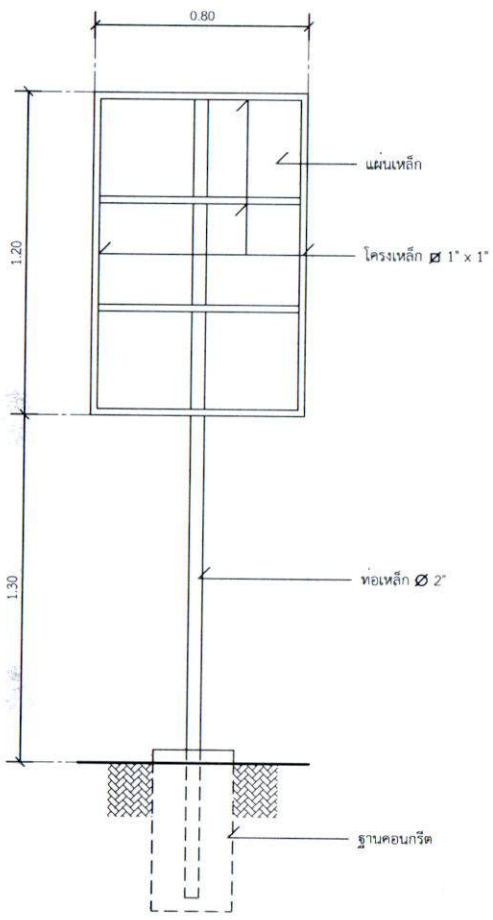

รูปด้านหลัง
มาตราส่วน 1 : 20

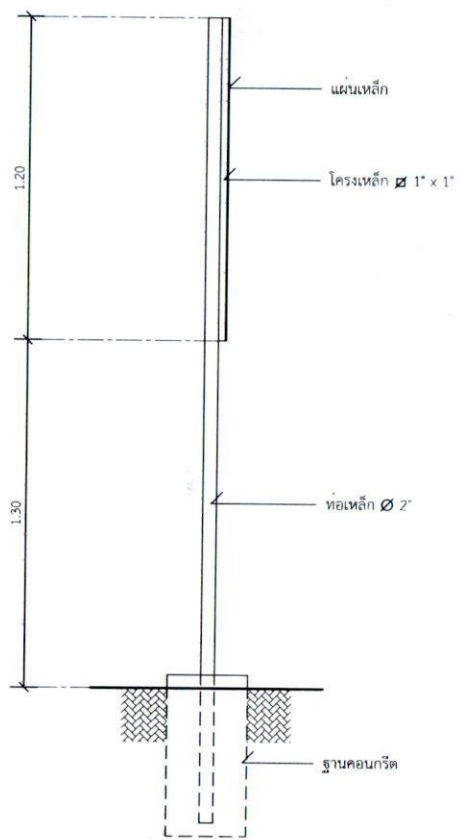

รูปด้านข้าง
มาตราส่วน 1 : 20

สัญญาลักษณ์หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

โครงการ :

ขนาด :

งบประมาณ :

ที่มาของงบประมาณ :

ระยะเวลาค้าประกันสัญญา.....ปี

เริ่มต้น :

สิ้นสุด :

ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน
"โปรดช่วยกันรักษา"

หากพบความชำรุดบกพร่อง แจ้ง โทร.

พื้นที่เขียน อักษรสีขาว

พื้นที่ขาว อักษรสีดำ

พื้นที่เขียน อักษรสีขาว

แบบขยายข้อความป้าย
มาตราส่วน 1 : 10

- รายการประกอบแบบ
1. เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้ทาสีน้ำมันสีเขียว
 2. พื้นป้ายด้านหน้าทาสีน้ำมันตามแบบ
 3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2 หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางสวย กุณอก - ถนน คสล. หน้าสวนนางเหรียญทอง แผ้วชำนาญ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
แบบเลขที่ จข 2-1/2566
ขนาดโครงการ ขนาดกว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 204 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 91.80 ลูกบาศก์เมตร(แน่น)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคา ทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	612.00	1.76	1,077.12	1.3624	2.40	1,468.80
2	งานผิวทาง				-			-
	- หินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	91.80	972.29	89,256.22	1.3624	1,324.65	121,602.87
	และบดอัดแน่นให้เรียบร้อย							
					90,333.34		รวม	123,071.67
							คิดเป็นประมาณการ	123,000.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง					201.0975		=	90,333.34
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง							=	1.3624

ประมาณราคาเมื่อ พฤษภาคม 2566

ผู้ประมาณราคา นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

ลงชื่อ.....
 (นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวมยุรี รักษาภักดี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)


(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

รายละเอียดการประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (32.21 บาท/ลิตร)

1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทาง

ขนาดเบา

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม

1.76

รวมค่างานต้นทุน

= 1.76 บาท/ตร.ม.

2 งานหินคลุก

ค่าวัสดุ(ราคาแหล่งผลิต)

= 205.61 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งจาก โรงโม่หิน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น (รถสิบล้อ-พ่วง)

170 กม. = 383.33 บาท/ลบ.ม.

รวม

= 588.94 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว x 1.5

= 883.41 บาท/ลบ.ม.

ค่าผสม (Blen) (ผสมกับวัสดุอื่น)

= - บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

= 88.88 บาท/ลบ.ม.

รวมค่างานต้นทุน

= 972.29 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ



(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



นางสาวมยุรี รักษาภักดี

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ครีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทัศนวรรณ ต่อชีพ)

ทัศนวรรณ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ศิริยาภรณ์

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

ปริมาณ

สถานที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหน้าศาลา หมู่ที่ 2

ขนาดกว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 204 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 91.80 ลูกบาศก์เมตร(แน่น)

จากบ้านนางสวย กุณอก - ถนน คสล. หน้าสวนนางเหรียญทอง แฝ้วชำนาญ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	612	ตร.ม.	1.76	1077.12	20	12240	13,317.12	
2	งานผิวทาง								
	- หินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่ง	91.80	ตร.ม.	972.29	89,256.22	50	4590	93,846.22	
	และบดอัดแน่นให้เรียบร้อย								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						107,163.34		บาท	
ค่าดำเนินการและกำไร						6,855.35		บาท	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม						7,981.31		บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						122,000.00		บาท	
ตัวอักษร						หน้างานสวนนางเหรียญทอง			

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ นวมานอก) ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง..... หน้ะสนส่ววิดิ

หก/บริษัท..... หน้ะสนส่ววิดิ โซคุดมก่อสร้าง

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ครีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



ใบเสนอราคา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

๑. ข้าพเจ้า นางนันทน์ส่วนจำกัด โสภณพัฒน์สงฆ์ อยู่บ้านเลขที่ 87 ถนน นพ 5
ตำบล/แขวง คูบุด อำเภอ/เขต ค้อ จังหวัด นครราชสีมา
โทร. 0817900014 โดย นายสุทธิศักดิ์ พรหมมาหนัก ผู้ลงนามข้างท้ายนี้

ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารโดยตลอดและยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น อยู่ในขณะเสนอราคาครั้งนี้

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โครงการก่อสร้างถนนหนทางในเขต บ้านคูบุด นพที่ 5
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป รายการละเอียด ประมาณการราคาตามดังกล่าวที่ได้รับไว้ในบัญชีแสดงรายการวัสดุ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 122,000 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 70 วัน นับแต่วันเสนอราคาและองค์การบริหารส่วนตำบลอาจ
รับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลว่าได้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารเสนอราคา โดย
ครบถ้วนถูกต้องภายใน 60 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างกับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา
เป็นจำนวนร้อยละห้า (๕ %) ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดย
ถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วน
ตำบลอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้
ข้าพเจ้าขอมอบ เงินสดค่าประกันหกหมื่นบาทถ้วน เพื่อเป็นหลักประกันสัญญาเป็น
จำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) มาพร้อมกันนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้วและ
เข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน

(ลงชื่อ) นางนันทน์ส่วนจำกัด
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมาหนัก)
ตำแหน่ง หุ้นส่วนจำกัด ประทับตรา (ถ้ามี)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหน้าคา หมู่ที่ 2

สายทางจากบ้านนางสวย กุนอก ถึง ถนน ค.ส.ล. หน้าสวนนางเหรียญทอง แฝ้วชำนาญ

ขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 204 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 91.80 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ค. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบเช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

งานทาง

งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GI Pt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GI Po	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Pet	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ลงชื่อ




ตรวจ

นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



เห็นชอบ

นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบัติ

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ลงชื่อ



อนุมัติ


นายอนุเมธ ศรีนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(ลงชื่อ).....
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	5	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
2	ส่งตัวอย่างวัสดุทดสอบ	รวม/วัน	รวม	22	
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	11,000 ตร.ม./วัน	612 ตร.ม.	1	
4	งานหินคลุก	500 ลบ.ม./วัน	91.80 ลบ.ม.	2	
5	งานบดทับเครื่องจักร	2,700 ลบ.ม./วัน	91.80 ลบ.ม.	1	
6	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	5	
7	ผลทดสอบความแน่นในสนาม	รวม/วัน	รวม	22	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

60

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นาย สิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

พยาน

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โครงการ : ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยคา หมู่ที่ 2

ขนาด กว้างประมาณ 3.00 เมตร ยาวประมาณ 204.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 91.80 ลูกบาศก์เมตร (แน่น)

งบประมาณ 122,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ที่มาของงบประมาณ เงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระยะเวลาค่าประกันสัญญา 1 ปี
(เริ่มต้น วันที่ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน)
สิ้นสุด วันที่.....

ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน
“โปรดช่วยกันรักษา”

หากพบความชำรุดบกพร่องโปรดแจ้ง โทร 044976218

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดและรายละเอียดตามแบบกำหนด
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน อักษรเขียนมีความคงทนถาวร ไม่หลุดร่วงง่าย ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ความสวยงาม และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินโครงการ

ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โทร 044976218

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2
ปริมาณงาน ขนาดกว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 204 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 91.80 ลูกบาศก์เมตร (แน่น) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)

วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 126,800 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางค่าก่อสร้าง 123,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 122,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ที่อยู่เลขที่ 87 หมู่บ้านหนองหว้าน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลคูขาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา โทร 0817900014

สัญญาเลขที่ ส 15/2566 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

วันเริ่มสัญญา 15 มิถุนายน 2566 วันสิ้นสุดสัญญา 13 สิงหาคม 2566

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายสายันต์ พันธุ์วัง	ประธานกรรมการ	โทร 0973347836
2. นางสาววนิดา บรรดาศักดิ์	กรรมการ	โทร 0898272527
3. นางภาวิณี ไพราม	กรรมการ	โทร 0918286303
4. นายสุรัตน์ นฤมลชวลิต	กรรมการ	โทร 0887450786
5. นายคารมณ ศรีเวช	กรรมการ	โทร 0895375616

ผู้ควบคุมงาน

นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 0641699329

ขอภัยในความไม่สะดวก

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้ไม้อัดหรือป้ายไวนิลขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร มีเสา
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน ใช้พื้นป้ายสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว
อักษรเขียนหรืออักษรสติ๊กเกอร์ไวนิลมาติดตั้งทับโครงป้ายก็ได้ ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความปลอดภัย ความสวยงามแก่ผู้ใช้ประโยชน์

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



ที่ 100922062404



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303547003692

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

4,600,000.00 บาท

2. นายณรงค์ฤทธิ์ จิตนอก

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

400,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่บ้าน หนองหัวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลคูขาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

(นางสาวจिरันท์ แห้วตระกูลปัญญา)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
towards Digital
Transformation



ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

ที่ 100922062404



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922062404

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ว.2 (ว.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์



วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ กิจกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ไร่ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ โรงงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ




ทะเบียนเลขที่ 0307334703699



แบบ ทล. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547

ออกให้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2547



ช. หุ้นส่วนจำกัด
ช. อดุมก่อสร้าง

1970
10



1000/1000

1000/1000

1000/1000

1000/1000

1000/1000

1000/1000

1000/1000

1000/1000

1000/1000

1000/1000

1000/1000

THAI
SME-GP

ที่ 30337/2565

สสว. >>

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย สุทธิศักดิ์ พรหมมานอก
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0303547003692
	วันที่อนุมัติ	26 กรกฎาคม 2565

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
פטศ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดפטศและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างפטศที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายชวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ตามที่ระบุไว้ใน
งบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2564



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

หุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง


บัตรประชาชนไทย Thai National ID Card
 เลขที่บัตรประชาชน Identification Number **1 3012 00004 73 1**

นามสกุล นาม **สุทธิศักดิ์ พรหมานอก**
 Name **Mr. Suttisak**
 นามสกุล **พรหมานอก**
 Last name **Prommanok**

เกิดวันที่ **28 ก.พ. 2527**
 Date of Birth **28 Feb. 1984**

ที่อยู่ **89 หมู่ 8 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.บึงสามพัน**
 Address **89 Moo 8 T. Bueng Sa Phan A. Bueng Sa Phan C. Bueng Sa Phan**

วันที่ออกบัตร **27 ก.พ. 2574**
 Date of Issue **27 Feb. 2031**

วันที่หมดอายุ **27 ก.พ. 2574**
 Date of Expiry **27 Feb. 2031**

เลขประจำตัวประชาชน **1 3012 00004 73 1**
 Identification Number **1 3012 00004 73 1**



กำนันตำบลบ้านจำกั๊ด
 โชคคุณก่อสร้าง

เลขรหัสประจำบ้าน 3004-026081-0

รายการเกี่ยวกับบ้าน

สำนักทะเบียน * ข่าเดอคง

เล่มที่ 1

รายการที่อยู่ 89 หมู่ที่ 5

ตำบลคูซาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อหมู่บ้านหนองหัวน้ำน้อย

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 21 เมษายน 2551

ลงชื่อ

(นางสาวลักขณา สีหะมาต) นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 21 เมษายน 2551

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

3004-026081-0

ลำดับที่ 4

ชื่อ นายสุกฤษดิ์ หอมมานอก

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน

1-3012-00004-73-1 สถานภาพ

ผู้อาศัย

เกิดเมื่อ 28 ก.พ. 2527

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

สลิด

3-3097-00013-04-1 สัญชาติ

ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

พงษ์พันธ์

3-3012-00363-60-6 สัญชาติ

ไทย

มาจาก

20 หมู่ที่ 6 ต.เสมาใหญ่

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อ 1 ก.ค. 2558

นายทะเบียน

(น.ส.ลักขณา สีหะมาต)

ไม่

นายทะเบียน

ค้นสำเนาจาก

ใบแจ้งเกิดสร้าง



ที่ นม ๗๖๘๐๑/๒๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐

หนังสือรับรองผลงาน

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง โดย นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๘๗ หมู่บ้าน หนองหัวน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลคูซอด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายทางจากถนนสามแยกทิศตะวันตกบ้านนายพิทยา สนคงนอก ถึง นานางเอบ ช้างพลาย) บ้านตาจั่นใน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ลงหินคลุกขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความทาง ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ตาจั่น กำหนด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เริ่มสัญญาวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และตรวจรับงานจ้างเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ได้ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามสัญญาจ้างทุกประการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่นจึงขอออกหนังสือรับรองผลงานให้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม ฉิมนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.

โทร./โทรสาร. ๐ - ๔๔๘๗ - ๘๔๓๘







เลขที่ 129 / 2555

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ถนนกำแพงสงคราม นม 30000

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง สำนักงานเลขที่ 21/3 หมู่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2555 ดังนี้

โครงการเปิดทางน้ำ บ้านวังโพน หมู่ที่ 2 ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวนเงิน 2,688,000 บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ 237 / 2555 ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 โดยส่งมอบงานวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และคณะกรรมการตรวจรับงานวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

พร้อมคิดตั้งป้ายโครงการตามระเบียบที่กำหนด ผู้รับจ้างได้ทำงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์ตามรายละเอียดแบบแปลนของสัญญาจ้างทุกประการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงออกหนังสือรับรองผลงานให้ไว้เป็นหลักฐาน

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

"ยึดมั่นธรรมากับกาล บริการเพื่อประชาชน"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง
โช. ดมก่อสร้าง
